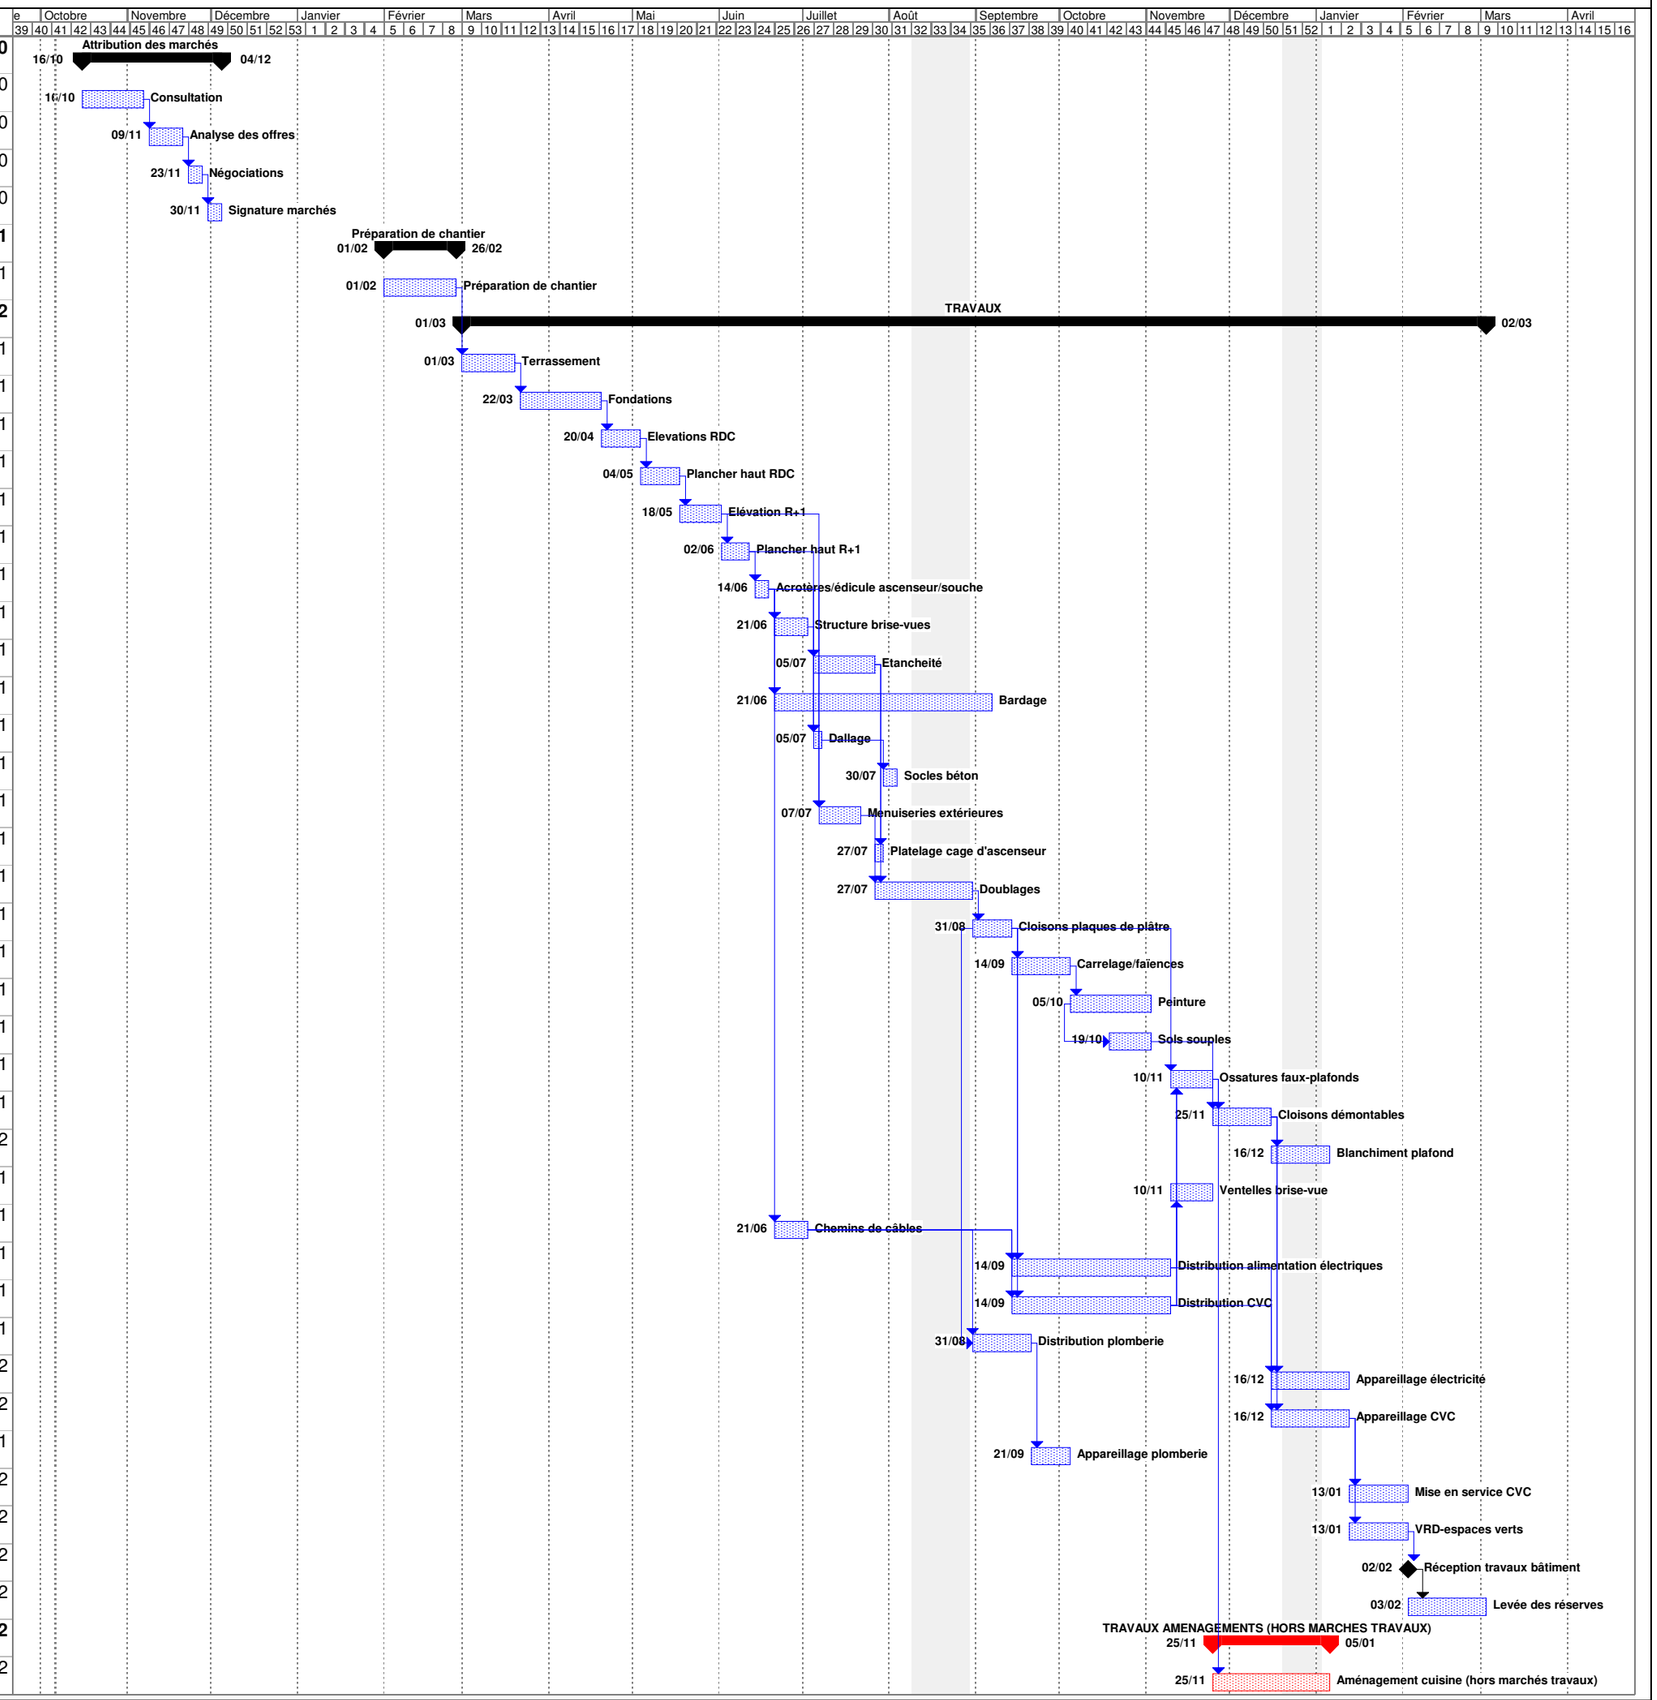N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Attribution des marchés**	**36 jours**	**Ven 16/10/20**	**Ven 04/12/20**
2	Consultation	16 jours	Ven 16/10/20	Ven 06/11/20
3	Analyse des offres	10 jours	Lun 09/11/20	Ven 20/11/20
4	Négociations	5 jours	Lun 23/11/20	Ven 27/11/20
5	Signature marchés	5 jours	Lun 30/11/20	Ven 04/12/20
6	**Préparation de chantier**	**20 jours**	**Lun 01/02/21**	**Ven 26/02/21**
7	Préparation de chantier	20 jours	Lun 01/02/21	Ven 26/02/21
8	**TRAVAUX**	**231 jours**	**Lun 01/03/21**	**Mer 02/03/22**
9	Terrassement	15 jours	Lun 01/03/21	Ven 19/03/21
10	Fondations	20 jours	Lun 22/03/21	Lun 19/04/21
11	Elevations RDC	10 jours	Mar 20/04/21	Lun 03/05/21
12	Plancher haut RDC	8 jours	Mar 04/05/21	Lun 17/05/21
13	Elévation R+1	10 jours	Mar 18/05/21	Mar 01/06/21
14	Plancher haut R+1	8 jours	Mer 02/06/21	Ven 11/06/21
15	Acrotères/édicule ascenseur/souche	5 jours	Lun 14/06/21	Ven 18/06/21
16	Structure brise-vues	10 jours	Lun 21/06/21	Ven 02/07/21
17	Etancheité	15 jours	Lun 05/07/21	Lun 26/07/21
18	Bardage	40 jours	Lun 21/06/21	Lun 06/09/21
19	Dallage	3 jours	Lun 05/07/21	Mer 07/07/21
20	Socles béton	3 jours	Ven 30/07/21	Mar 03/08/21
21	Menuiseries extérieures	10 jours	Mer 07/07/21	Mer 21/07/21
22	Platelage cage d'ascenseur	3 jours	Mar 27/07/21	Jeu 29/07/21
23	Doublages	10 jours	Mar 27/07/21	Lun 30/08/21
24	Cloisons plaques de plâtre	10 jours	Mar 31/08/21	Lun 13/09/21
25	Carrelage/faïences	15 jours	Mar 14/09/21	Lun 04/10/21
26	Peinture	20 jours	Mar 05/10/21	Mar 02/11/21
27	Sols souples	10 jours	Mar 19/10/21	Mar 02/11/21
28	Ossatures faux-plafonds	10 jours	Mer 10/11/21	Mer 24/11/21
29	Cloisons démontables	15 jours	Jeu 25/11/21	Mer 15/12/21
30	Blanchiment plafond	5 jours	Jeu 16/12/21	Mer 05/01/22
31	Ventelles brise-vue	10 jours	Mer 10/11/21	Mer 24/11/21
32	Chemins de câbles	10 jours	Lun 21/06/21	Ven 02/07/21
33	Distribution alimentation électriques	40 jours	Mar 14/09/21	Mar 09/11/21
34	Distribution CVC	40 jours	Mar 14/09/21	Mar 09/11/21
35	Distribution plomberie	15 jours	Mar 31/08/21	Lun 20/09/21
36	Appareillage électricité	10 jours	Jeu 16/12/21	Mer 12/01/22
37	Appareillage CVC	10 jours	Jeu 16/12/21	Mer 12/01/22
38	Appareillage plomberie	10 jours	Mar 21/09/21	Lun 04/10/21
39	Mise en service CVC	15 jours	Jeu 13/01/22	Mer 02/02/22
40	VRD-espaces verts	15 jours	Jeu 13/01/22	Mer 02/02/22
41	Réception travaux bâtiment	0 jour	Mer 02/02/22	Mer 02/02/22
42	Levée des réserves	20 jours	Jeu 03/02/22	Mer 02/03/22
43	**TRAVAUX AMENAGEMENTS (HORS MARCHES TRAVAUX)**	**20 jours**	**Jeu 25/11/21**	**Mer 05/01/22**
44	Aménagement cuisine (hors marchés travaux)	20 jours	Jeu 25/11/21	Mer 05/01/22
